

PROPUESTA DE DESARROLLO POR HITOS


La base tecnológica de **una proptech**

PREPARADA PARA EL SEED

GRAN CONCEPCIÓN • JULIO MMXXVI

NICOLÁS MORENO

DESARROLLADOR FULL-STACK • NEXT.JS • SUPABASE

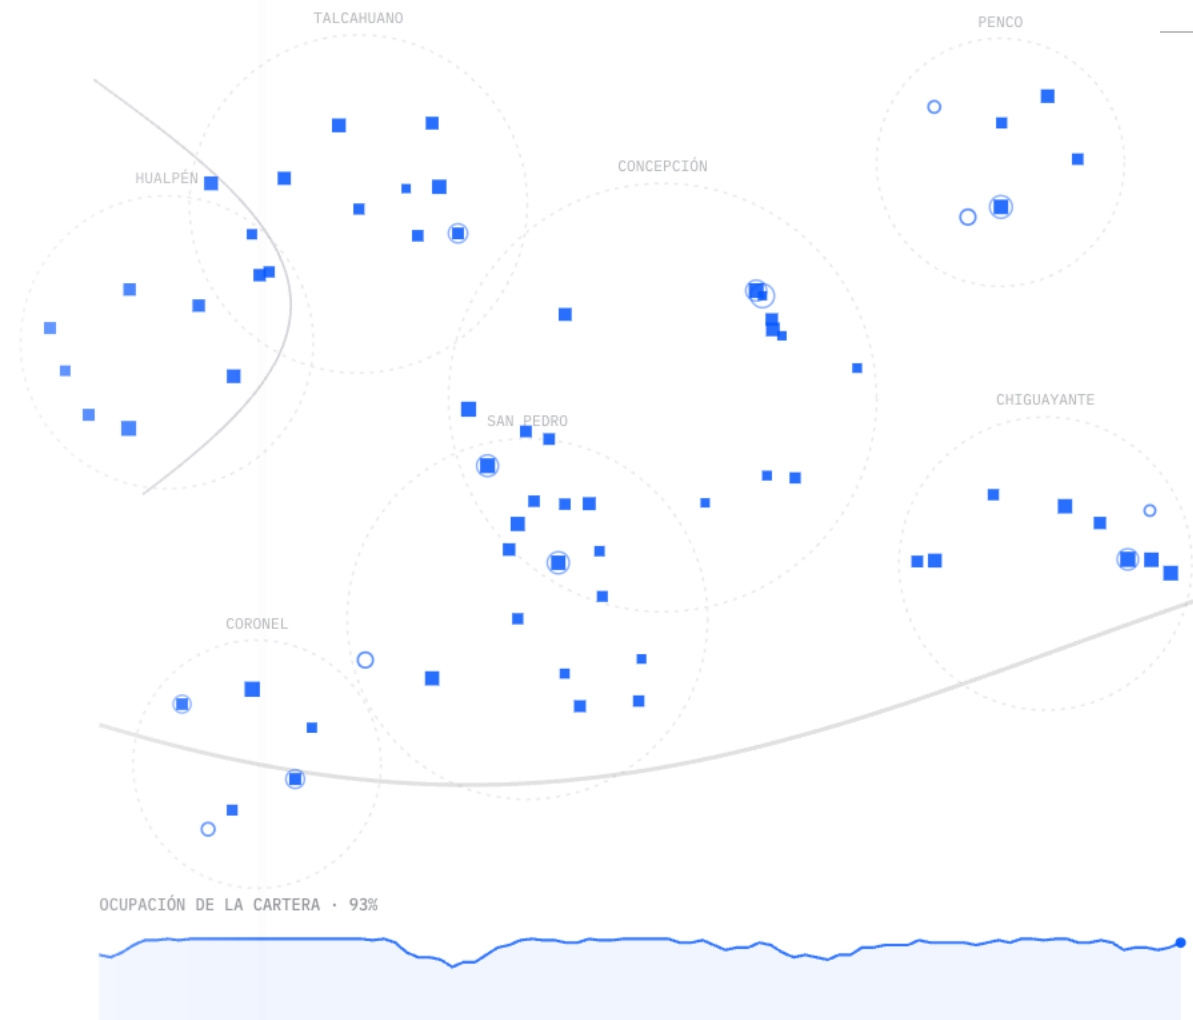

ESQUEMA / AISLAMIENTO / INTEGRACIÓN

PP.SEED-2026-001


SOBRE ESTE DOCUMENTO

Escrito para un solo destinatario

Este material se entrega a **el seed** con el fin exclusivo de evaluar mi propuesta para los hitos descritos en su convocatoria. No está indexado y no se ha compartido con nadie más.

Todo lo que sigue —el alcance, los plazos y los valores— sale de leer su aviso con atención. **No he tenido acceso a su operación**, y el documento es explícito cada vez que eso importa: lo que se puede afirmar está separado de lo que hay que preguntar.

Un proveedor que llega con certezas sobre una operación que no ha visto está adivinando. Prefiero llegar con **las preguntas correctas**.

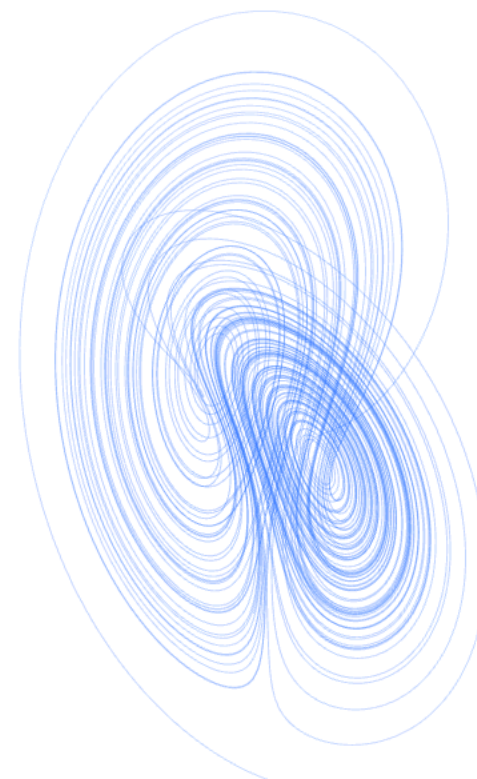

POR QUÉ YO

Ya construí esto, en **este mismo stack**, para un rubro con la misma forma

Su convocatoria pide Next.js con App Router, Supabase con RLS y Storage, automatizaciones por webhook e integraciones con WhatsApp, firma y pasarelas locales.

Esa es, línea por línea, la plataforma que construí y mantuve para **GoAuto**: un sistema multi-cliente sobre Supabase, con cobros por MercadoPago y avisos por WhatsApp.

Cambia el activo —un vehículo por un inmueble— y cambian las palabras. La arquitectura es la misma: **activos, mandantes, publicaciones, contratos y plata que entra a fecha**.

LO QUE ESO SIGNIFICA PARA EL HITO 1

No voy a aprender RLS con su base de datos. Las **391 políticas** que hoy sostienen la separación entre automotoras se escribieron y se depuraron una por una, incluyendo la parte que nadie cuenta: migrar el aislamiento de un sistema vivo **sin quitarle acceso a nadie que ya lo tenía**.

Un esquema mal puesto no se nota en el hito 1. Se nota en el hito 4, cuando hay que integrar la pasarela y resulta que **el pago no sabe a qué mandato pertenece**.

NICOLÁS MORENO

JULIO 2026
PP.SEED-2026-001

SEÑORES
EL SEED
PRESENTE

Ref.: Base tecnológica – esquema, portal, automatización e integraciones

De mi consideración:

Presento mi propuesta para levantar la base tecnológica de el seed, estructurada en los cuatro hitos que ustedes mismos definieron y en el mismo orden en que los enumeraron.

Trabajo solo, por hitos, con entregables revisables en su propia infraestructura. No hay equipo que coordinar ni retainer que justificar: **cada hito se acepta o se rechaza mirando algo que funciona**, en su Supabase y en su repositorio, no en una demo mía.

Sobre el primer hito quiero ser directo: el esquema y las políticas de aislamiento son la única parte de este proyecto que **se paga cara si se hace rápido**. Los otros tres se pueden rehacer. Ese no.

Quedo atento a sus comentarios.

NICOLÁS MORENO
DESARROLLADOR FULL-STACK

FICHA

GITHUB
github.com/4mser

PORTAFOLIO
nicolas-moreno.vercel.app

UBICACIÓN
Santiago de Chile
Remoto · huso de Chile

DISPONIBILIDAD
20 horas semanales
Inicio inmediato

VIGENCIA
30 días corridos
desde la emisión

CONTACTO
Por la plataforma,
mientras dure el proceso

Cinco secciones. Del esquema a la disponibilidad.

01

Entendimiento

Lo que el aviso permite afirmar, y lo que hay que preguntar antes del primer commit.

02

Los cuatro hitos

Qué se construye en cada uno y con qué se acepta.

03

Método

Cómo se entrega un hito y en qué semana cae cada cosa.

04

Credenciales

Sistemas en producción, en este mismo stack, con sus cifras.

05

Honorarios

Valor por hito, forma de pago y disponibilidad semanal.

-


Lo que no incluye

Declarado adentro, en la sección 02. Una propuesta sin exclusiones es una propuesta incompleta.

01

Entendimiento

LO QUE SE AFIRMA ·
LO QUE SE PREGUNTA

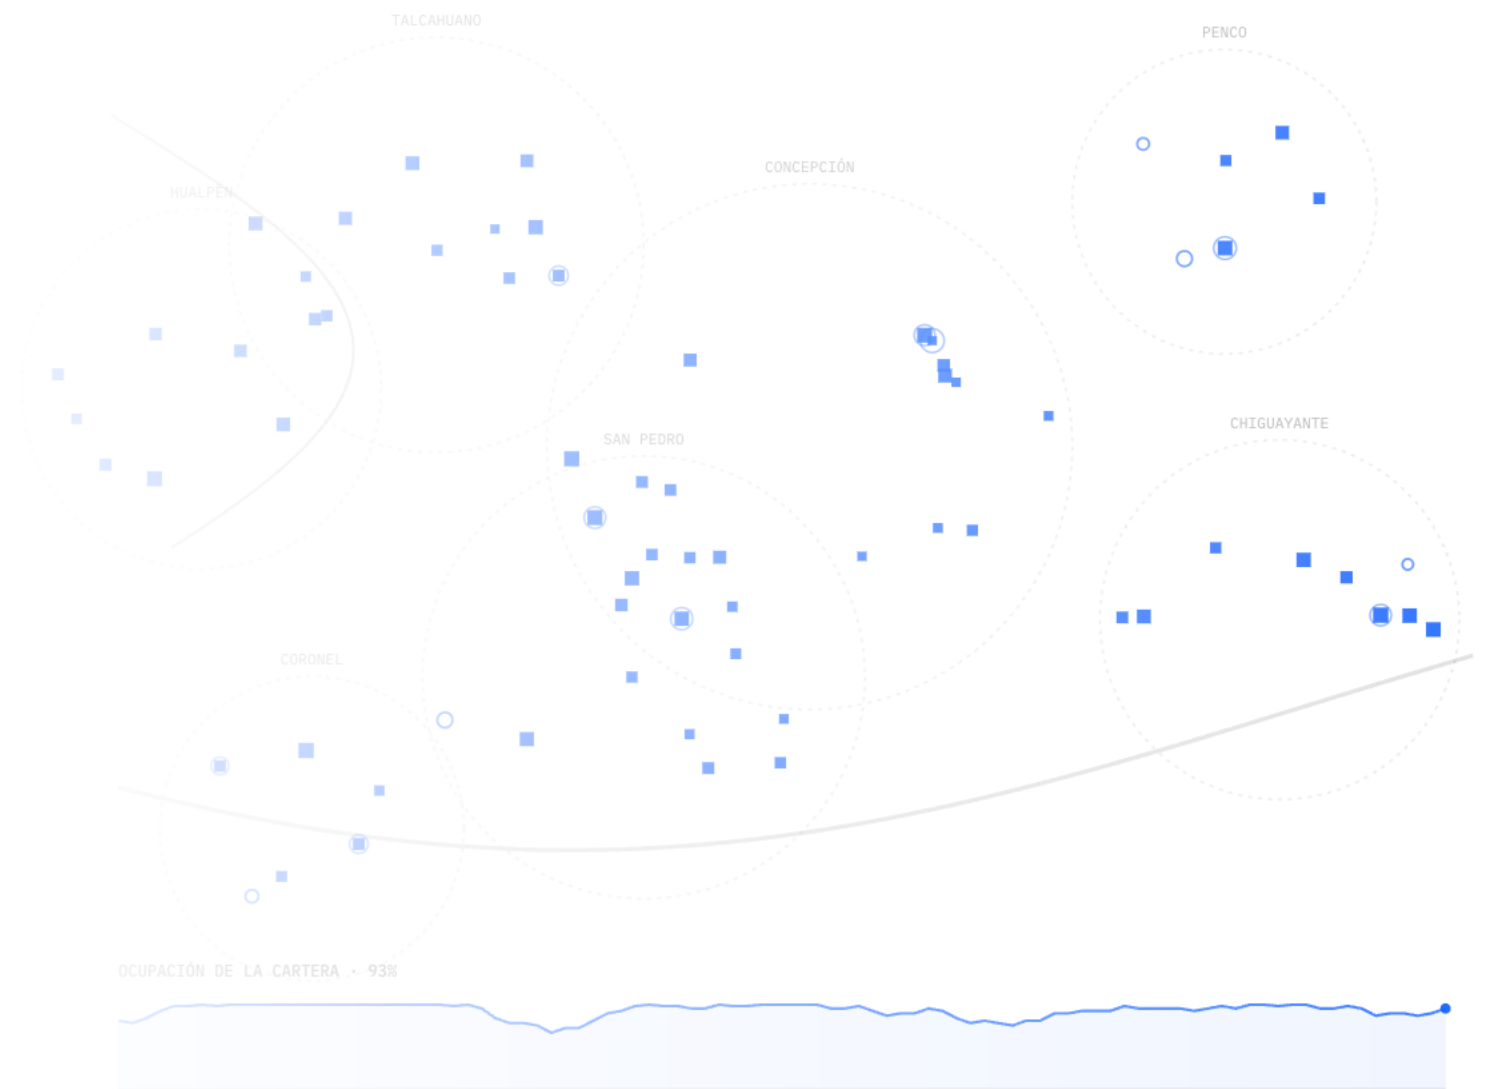

01 · ENTENDIMIENTO

el seed no administra propiedades.
Administra plata y responsabilidad ajenas.

Un sistema de arriendos parece un catálogo con fotos. No lo es. Debajo hay un contrato entre dos personas que no se conocen, y una tercera —ustedes— que responde por que el dinero llegue, el inmueble se conserve y los plazos se cumplan.

Eso tiene una consecuencia técnica directa: **casi ningún dato de este sistema es público para todos los que lo usan**. El propietario no puede ver el informe comercial del arrendatario. El arrendatario no puede ver la comisión que ustedes cobran. El corredor de una cartera no puede ver la de otro.

Por eso el aviso pone **RLS en el primer hito y no en el tercero**, y por eso me parece la decisión correcta.

Las tres verticales que nombran —administración, corretaje y gestión de activos— no son tres productos. Son **tres roles mirando el mismo inmueble** con permisos distintos. Esa es la abstracción que el esquema tiene que capturar.

3 VERTICALES EN UN MISMO MODELO	4 HITOS DEFINIDOS EN LA CONVOCATORIA	1 DE ELLOS ES IRREVERSIBLE	20 _{h/sem} DEDICACIÓN QUE OFREZCO
------------------------------------	---	-------------------------------	---

01 · ENTENDIMIENTO

Las seis preguntas que hay que cerrar **antes del primer commit**

Ninguna es de gusto. Cada una cambia una tabla o una política, y todas son más baratas de contestar ahora que en el hito 4.

01 · EL MANDATO

¿Un mandato cubre una unidad o varias? ¿Una unidad puede tener mandatos sucesivos con distintos corredores? Define si el mandato es una columna o **una tabla con vigencia**.

02 · EL REAJUSTE

¿El arriendo se pacta en pesos, en UF o con reajuste por IPC? Define si el monto es **un número o una fórmula con historia**, y eso no se cambia después sin migrar todos los contratos.

03 · LA RECAUDACIÓN

¿el seed recauda y luego liquida al propietario, o el arrendatario paga directo? Cambia la pasarela, la conciliación y **quién carga con el riesgo del no pago**.

04 · EL PROPIETARIO

¿Entra al portal él mismo, o el corredor opera en su nombre? Es la diferencia entre una política por **owner_id** y **una por delegación**.

05 · LA FIRMA

¿Firma electrónica simple o avanzada? La avanzada obliga a un proveedor acreditado y a un flujo distinto. Cambia el costo del hito 4, **no su arquitectura**.

06 · EL DATO PERSONAL

Un arriendo guarda RUT, renta e informes comerciales. Con la nueva ley de datos entrando en vigencia, conviene que **el borrado y el consentimiento estén en el esquema** desde el día uno.

01 · ENTENDIMIENTO

El aislamiento no es
una capa encima.
Es el esquema.

Una fila que se filtra en este sistema no es un error de interfaz: es **el contrato de arriendo de otra persona**, con su renta y su RUT, entregado a quien no debía verlo.

La política se escribe una vez por tabla y se prueba rol por rol. Lo que se ve al costado es exactamente eso: la misma tabla, cuatro roles, y cuántas filas entrega la base a cada uno.

Se hace en el hito 1 o no se hace. Agregar RLS sobre un sistema que ya está en producción es un proyecto aparte – **lo he hecho, y por eso lo digo.**

PUBLIC.LEASE_CONTRACTS

ARRENDATARIO
`tenant_id = auth.uid()`

PROPIETARIO
`unit_id in (select ... where owner_id = ...)`


CORREDOR
`agency_id = current_agency()`

ADMIN
`is_admin()`

02

Los cuatro **hitos**

QUÉ SE CONSTRUYE ·
CON QUÉ SE ACEPTA

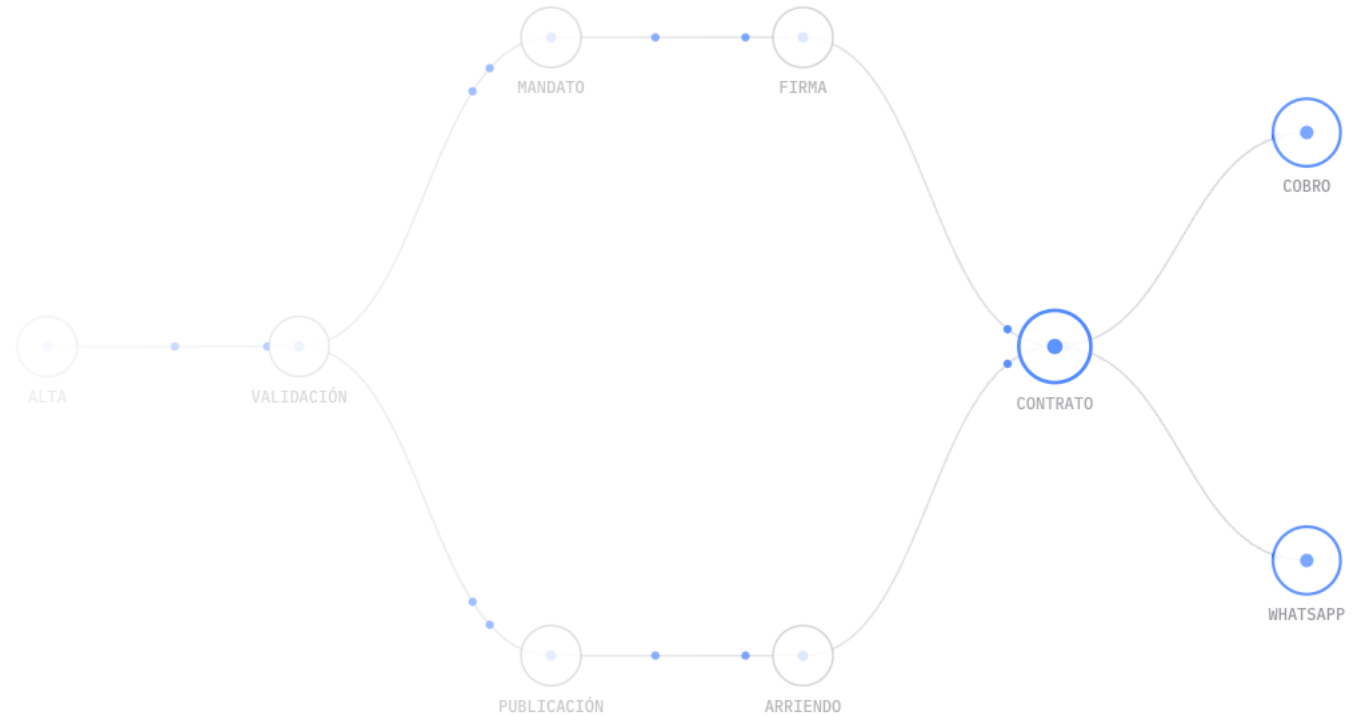

02 • HITO 1 – SEMANAS 1 A 2

Esquema, autenticación y aislamiento por fila

QUÉ SE ENTREGA

- Modelo de datos completo: propiedades, unidades, propietarios, mandatos, arrendatarios, contratos, pagos, gastos y documentos.
- Migraciones versionadas en el repositorio – la base se reconstruye desde cero con un comando.
- Auth con roles y perfil, sobre los proveedores que ustedes elijan.
- Políticas de RLS por rol, y Storage con políticas propias por bucket.
- Datos de siembra para poder probar los cuatro roles el mismo día.

CÓMO SE ACEPTA

Con una **matriz de pruebas de acceso**: por cada tabla y cada rol, qué filas devuelve la base. Se corre delante de ustedes contra su propio proyecto de Supabase.

Si una sola celda entrega de más, el hito no está terminado.

Este hito no produce nada que se pueda mirar en una pantalla bonita, y esa es exactamente la razón por la que se subcontrata mal. **Es el único que compromete a los otros tres.**

02 • HITO 2 — SEMANAS 3 A 5

Estructura en Next.js y **portal del propietario**

QUÉ SE ENTREGA

- Proyecto Next.js con App Router y Tailwind, desplegado y con vistas previas por rama.
- Sesión de Supabase resuelta en el servidor, con middleware y rutas protegidas por rol.
- Portal del propietario: sus unidades, estado de arriendo de cada una, pagos recibidos, documentos y liquidaciones.
- Capa de datos tipada desde el esquema — si el esquema cambia, el build avisa.
- Diseño responsivo: el propietario entra desde el teléfono.

CÓMO SE ACEPTA

Ustedes entran con una cuenta de propietario real de prueba y ven **sólo sus unidades**. Entran con otra y ven las suyas.

El aislamiento del hito 1 queda demostrado por la interfaz, no por mi palabra.

El portal del propietario es el primer entregable que ustedes pueden **mostrarle a un cliente**. Por eso va segundo y no cuarto.

02 · HITO 3 — SEMANAS 6 A 7

Workflows de alta, mandato y **ciclo de arriendo**

QUÉ SE ENTREGA

- n8n desplegado con sus credenciales, en su infraestructura, con los flujos exportados y versionados en el repositorio.
- Alta de propiedad: validación, carga de documentos y publicación.
- Mandato: generación, envío a firma y activación al quedar firmado.
- Ciclo de arriendo: cobro del período, recordatorios previos y posteriores, y aviso de vencimiento de contrato.
- Webhooks entrantes y salientes, con reintento y registro de cada ejecución.

CÓMO SE ACEPTA

Se da de alta una propiedad de prueba y **el flujo corre entero delante de ustedes**, con el registro de cada paso a la vista.

Los flujos quedan **exportados en el repositorio**, no sólo vivos en la instancia. Un n8n que sólo existe en su servidor es una dependencia con otro nombre.

Si prefieren no operar n8n, los mismos flujos se implementan como Edge Functions con cron. Lo conversamos en el hito 1, no acá.

02 · HITO 4 — SEMANAS 8 A 10

Integraciones: WhatsApp, firma electrónica y pagos

WHATSAPP BUSINESS

Plantillas aprobadas para aviso de cobro, recordatorio y vencimiento. Recepción de respuestas y registro contra el contrato que las originó.

Ya integrado en producción en GoAuto, con notificaciones por cliente.

FIRMA ELECTRÓNICA

Envío del mandato y del contrato a firma, seguimiento del estado y archivo del documento firmado contra su registro, con su huella.

El proveedor se elige según la respuesta a la pregunta 05.

PASARELA DE PAGOS

Cobro del arriendo, webhook de confirmación **idempotente** y conciliación diaria contra lo que el proveedor dice haber cobrado.

Fintoc, Khipu o Webpay según lo que ya tengan contratado.

Sobre la pasarela, una advertencia que sale de haberlo hecho: **el webhook de pago llega dos veces**. Llega repetido, llega fuera de orden y a veces llega antes que la respuesta de la propia llamada. Un cobro de arriendo que se registra dos veces es una liquidación mal hecha a un propietario. Por eso la idempotencia y la conciliación van dentro del hito y no se cotizan aparte.

02 · LÍMITES

Lo que **no** está incluido

Declarado acá para que no aparezca como discusión en la semana ocho.

CONCEPTO	ESTADO
Diseño de identidad visual y marca	Fuera
Portal público de búsqueda con SEO	Fuera
Aplicación móvil nativa	Fuera
Migración de datos desde un sistema anterior	Se cotiza aparte
Contratación de proveedores y sus costos	A nombre de el seed

SUPUESTOS DE LOS QUE PARTE ESTA PROPUESTA


- Las cuentas de Supabase, Vercel, n8n y de cada proveedor se abren a nombre de el seed. Yo trabajo dentro de ellas.
- Hay una contraparte suya disponible para responder dudas dentro de un día hábil.
- Las seis preguntas de la sección 01 se cierran en la reunión de arranque.
- El diseño de interfaz parte de una biblioteca de componentes, no de maquetas a medida.

Todo queda a nombre de ustedes desde el primer día. **Si mañana siguen con otra persona, no hay nada que rescatar de mi lado.**

03

Método

CÓMO SE ENTREGA ·
CUÁNDO CAE CADA COSA

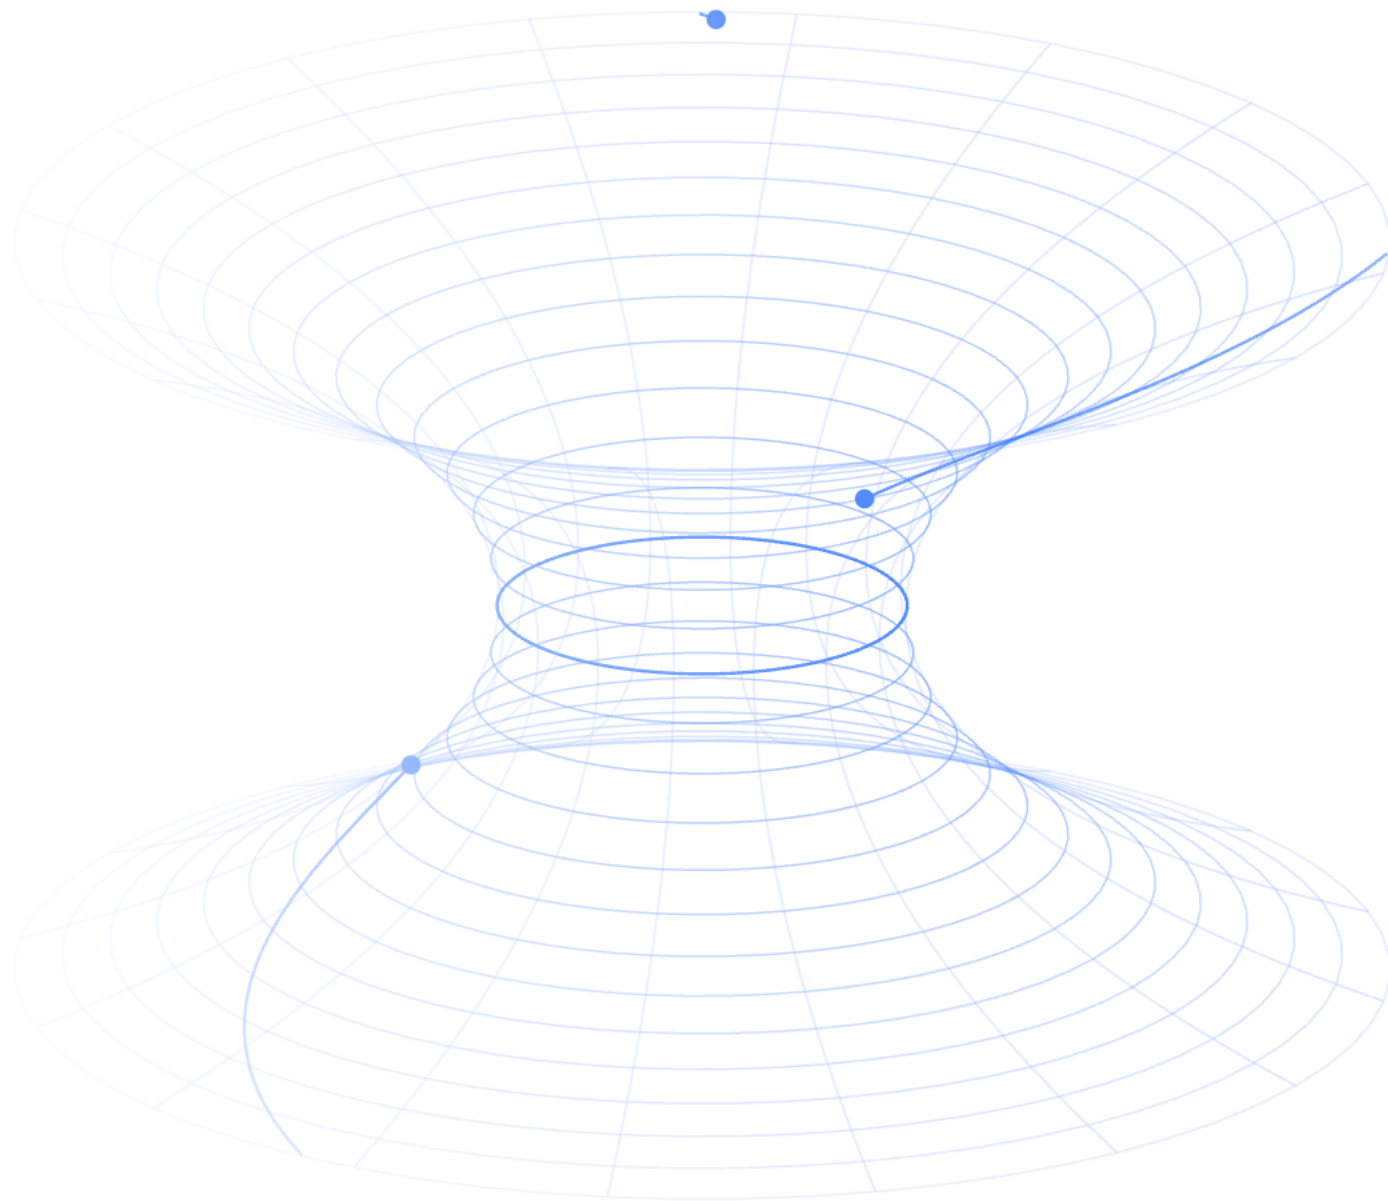

03 • MÉTODO

Un hito terminado es algo que **ustedes pueden romper**

ANTES DE EMPEZAR

Reunión de arranque de una hora. Se cierran las seis preguntas de la sección 01 y se levanta el acta. Sin eso, el hito 1 no parte.

TODOS LOS DÍAS

Commits en su repositorio, en una rama por hito. No hay código viviendo en mi máquina esperando el día de la entrega.

CADA SEMANA

Un mensaje escrito: qué se hizo, qué falta, qué me está bloqueando. Sin reunión si no hace falta una.

AL CERRAR UN HITO

Demostración en vivo sobre su infraestructura, contra la lista de aceptación que este documento ya declaró. Ustedes la corren, no yo.

DESPUÉS DE ACEPTAR

Diez días hábiles de corrección de defectos del hito, sin costo. Un defecto es algo que no cumple lo aceptado; no es un cambio de alcance.

Cada hito se factura al aceptarse. **Si un hito no se acepta, no se paga** – y si deciden parar ahí, se llevan igual todo lo que ya está en su repositorio y en su base de datos.

03 • CALENDARIO

Diez semanas, **unas 165 horas**




Las semanas corren desde el arranque, no desde la firma. **Puedo empezar dentro de la semana siguiente a su confirmación.**

Si el ritmo les acomoda más rápido, subo a treinta horas semanales y el calendario baja a seis semanas. El valor por hito no cambia.

04

Credenciales

EN PRODUCCIÓN · EN
ESTE MISMO STACK

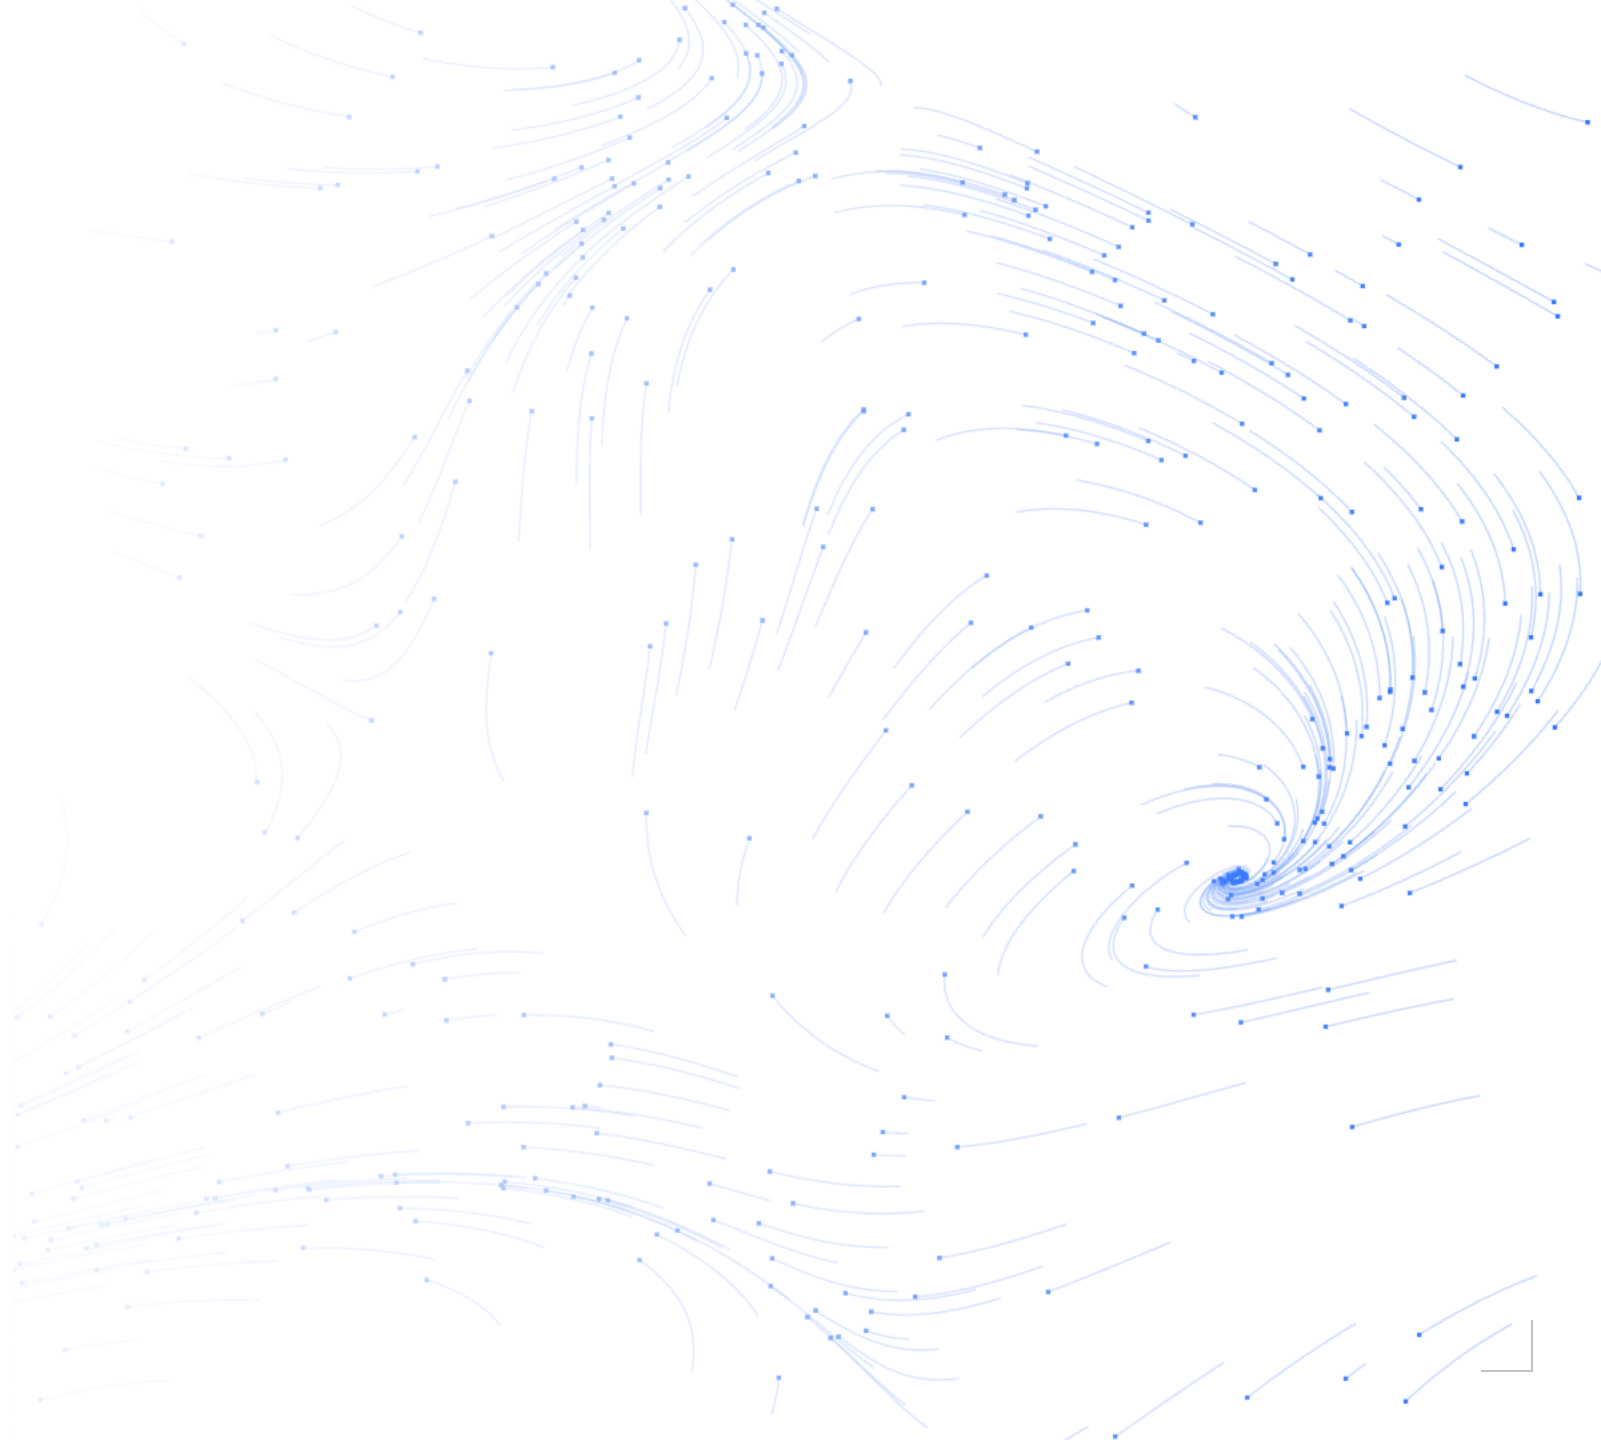

04 · PROYECTO RELEVANTE 1 DE 2

GoAuto — Next.js y Supabase, multi-cliente, en producción

Plataforma de gestión para automotoras. Cada automotora ve su inventario, sus leads y su facturación, y ninguna ve la de otra: exactamente el problema de aislamiento que el hito 1 de el seed plantea.

Sitio público en **Next.js con App Router** sobre Supabase; portal de gestión con dashboards y sesión por rol; y detrás, la parte que no se ve.

Incluye lo que el hito 4 pide: **MercadoPago** con webhooks idempotentes y conciliación por cron, **notificaciones por WhatsApp** configurables por cliente, y sincronización con Mercado Libre, ChileAutos y Meta.

391 POLÍTICAS DE RLS ESCRITAS	75 TABLAS CON AISLAMIENTO ACTIVO
241 MIGRACIONES VERSIONADAS	79 EDGE FUNCTIONS EN SUPABASE

EN LÍNEA

goauto.cl

El sitio público. El portal de gestión está tras login, en **portal.goauto.cl**.

04 • PORTALES CON LOGIN Y DASHBOARDS

Portales con login, uno por tipo de usuario

PLATAFORMA MULTI-CLIENTE • NEXT.JS



FIDELYA

Producto propio, del que soy fundador. Frontend en Next.js sobre una base aislada por cliente, con **tres portales distintos** —administración, comercio y cliente final— sobre el mismo modelo de datos. Más de 3.500 usuarios registrados.

Por qué importa acá: es el mismo ejercicio que el portal del propietario. Un usuario, un rol, y una interfaz que sólo muestra lo que ese rol puede ver.

PORTAL DE GESTIÓN • TRAS LOGIN



PORTAL.GOAUTO.CL

El portal donde cada automotora entra con su cuenta y administra su inventario, sus leads, sus publicaciones y su facturación. Dashboards por rol sobre Supabase, con el aislamiento resuelto en la base.

Por qué importa acá: es el portal del propietario con otro nombre. Un mandante entra, ve sólo sus activos y opera desde ahí — que es exactamente el hito 2.

04 • SOBRE EL GITHUB

Una advertencia honesta sobre **lo que van a encontrar**

Mi perfil es github.com/4mser. Si entran ahora van a ver proyectos personales, varios de hace dos o tres años, y ninguno de los sistemas de los que habla la sección anterior.

La razón es simple y probablemente les pase con todos los candidatos serios: **el trabajo que importa vive en repositorios privados**. Los de cliente no son míos para abrirlos, y los propios —FIDELYA entre ellos— tampoco: es producto en operación, con clientes pagando.

Prefiero decirlo yo antes de que lo descubran haciendo clic.

CÓMO SE VERIFICA, ENTONCES

- **Pantalla compartida, sin preparación.** Abro el código de GoAuto en vivo y navegamos donde ustedes quieran: migraciones, políticas de RLS, Edge Functions e historial de commits.
- **Una prueba pagada.** Encárguenme el hito 1 y evalúen sobre eso. Es el hito más corto y el más revelador de los cuatro.
- **Los productos en línea.** goauto.cl y fidelya.cl están arriba y se pueden recorrer ahora mismo; el portal de gestión, tras login, se los muestro cuando quieran.


Las cifras de la lámina anterior —391 políticas, 241 migraciones, 79 funciones— **salen de contar los archivos del repositorio**, y se pueden contar de nuevo delante de ustedes.

05

Honorarios

VALOR POR HITO · FORMA
DE PAGO · DISPONIBILIDAD

CONTRATOS DEL MES, POR DÍAS HASTA EL PAGO

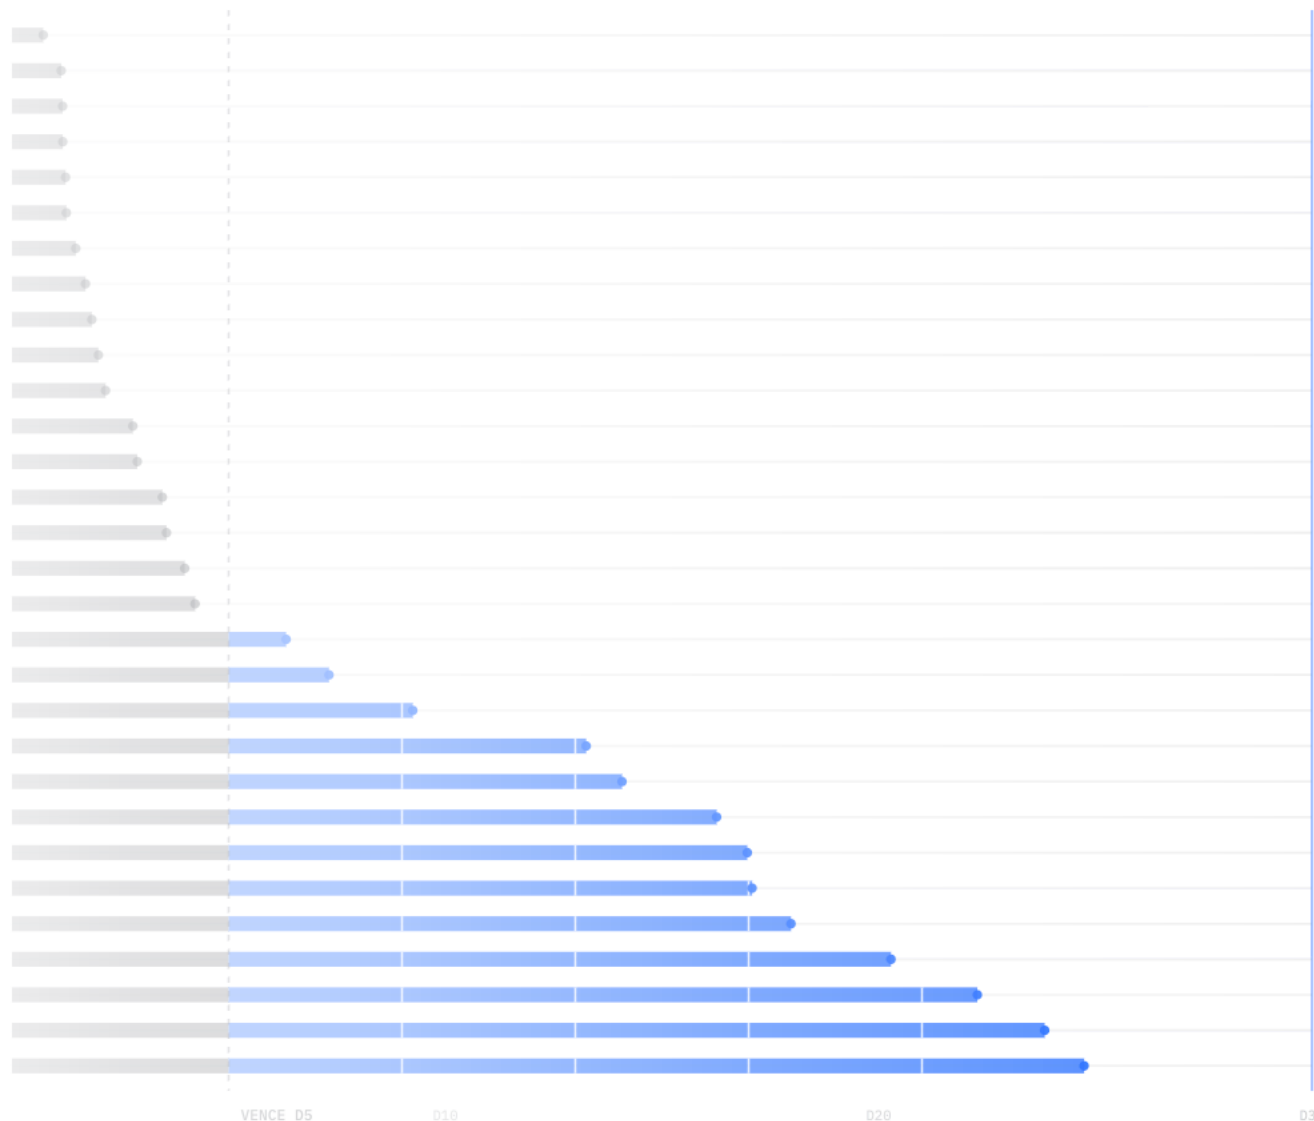

DÍA 30 · EN PLAZO 17 · RECUPERADOS 13 · EN GESTIÓN 0

Valor por hito

HITO	VALOR
H1 · Esquema, Auth y RLS en Supabase — semanas 1 a 2	\$ 620.000
H2 · Estructura Next.js y portal del propietario — semanas 3 a 5	\$ 1.240.000
H3 · Workflows de alta, mandato y arriendo — semanas 6 a 7	\$ 825.000
H4 · WhatsApp, firma electrónica y pasarela — semanas 8 a 10	\$ 1.440.000
Total de los cuatro hitos	\$ 4.125.000
Retainer mensual	No aplica
Infraestructura y proveedores	A nombre de el seed

FORMA DE PAGO

Cada hito se factura **contra aceptación**. Sin anticipo y sin pago por adelantado en ninguno de los cuatro.

FUERA DE ALCANCE

Trabajo adicional a **\$30.000 por hora**, acordado por escrito antes de ejecutarlo. Nunca a posteriori.

VALORES FIRMES

En pesos, sin reajuste durante los treinta días de vigencia. El total son **unas 165 horas** de trabajo a **\$25.000 la hora**.

05 · DISPONIBILIDAD

Veinte horas a la semana, en **su mismo huso horario**

DEDICACIÓN	20 horas semanales comprometidas. Puedo subir a 30 si el calendario les urge; el valor por hito no cambia, sólo la fecha.
HORARIO	Santiago de Chile. Solapamiento completo con el Gran Concepción – no hay diferencia horaria que administrar.
RESPUESTA	Dentro del día hábil por el canal que definan. Reuniones acotadas y agendadas, no llamadas sorpresa.
INICIO	Dentro de la semana siguiente a su confirmación.

POR QUÉ VEINTE Y NO CUARENTA

Porque veinte las cumpla todas las semanas, incluida la semana en que algo se caiga en otro proyecto. Cuarenta serían un número para ganar la propuesta y una conversación incómoda en la semana tres.

Su aviso dice que buscan a alguien **pragmático, ordenado y orientado a entregables revisables**. Ofrecer una dedicación que no puedo sostener sería fallar en las tres cosas antes de empezar.

Y por lo mismo: si en algún momento veo que un hito no llega en su fecha, **lo digo cuando lo veo**, no en la fecha.

EL ESQUEMA ES LA ÚNICA PARTE QUE NO SE PUEDE REHACER BARATO

NICOLÁS MORENO

DESARROLLADOR FULL-STACK · NEXT.JS · SUPABASE

github.com/4mser · nicolas-moreno.vercel.app

SANTIAGO · CHILE — JULIO 2026
